

PROJEKT NR 586562	PROJEKTSTART 2025-09-15	PROJEKTLUT 2025-09-25
PROJEKTNAMN Båtsman torrsättning höst -25		KUND Klart skepp Stocksund AB
PROJEKTLEDARE RINDÖVARVET Magnus Zetterlund		KONTAKT Ivar Kassman
PROJEKTBSKRIVNING Torrsättning och torrsättningspunkter		



Innehåll

30	Torrsättning, rangering och förvaring	2
40	Bottentvätt	2
50	Tjockleksmätning	2
60	Bottenbehandling	3
70	Lagerspel	4
80	Fix skalkning till förlig lucka	4

30 Torrsättning, rangering och förvaring

Ankom 12/9 2025. Torrsatt 25/9 2025

Sjösatt 24/9 2025


40 Bottentvätt

Arbete utfört: Botten avspolad med 500bar.

50 Tjockleksmätning

Arbete utfört: Tjockleksmätning utförd med 10 punkter per sida. Se protokoll nedan.
Se även separat bilaga.



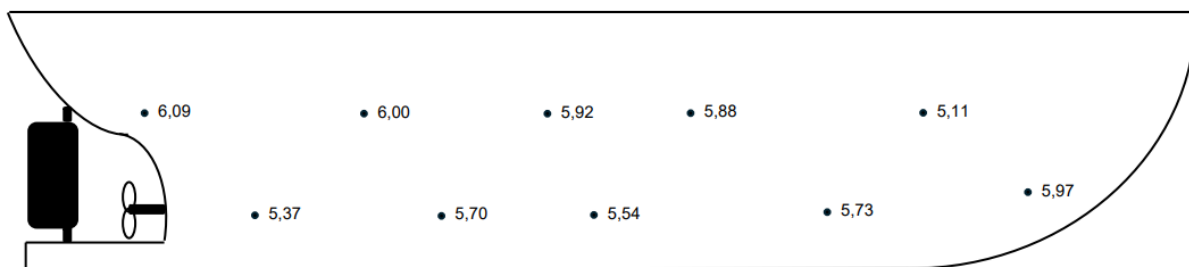

Rindövarvet AB
Rindövägen 2
185 41 Vaxholm

60 Bottenbehandling

Arbete utfört: Bottenbehandling utförd enligt internationals färgprogram.

Intershield 300 150my x2 T/C

Intergard 263 75my T/C

Interspeed 5617 BQA 150my F/C

T/C= Touch coat (Fläckmålning)

F/C= Full coat (Helmålning)





70 Lagerspel

Arbete utfört:
Propelleraxel 0,5mm

Roder uppe 1,2mm
Roder nere 1,2mm

80 Fix skalkning till förlig lucka

Arbete utfört: Svetsat fast låsningen på skalkningen på luckan så den går att låsa.

